

“दिगो विकास र सुशासनको लहर; ईन्द्रावती गाउँपालिकावासीको रहर”

स्थानीय सरकार



ईन्द्रावती गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

नवलपुर, सिन्धुपाल्चोक



Web Mail: info@indrawatimun.gov.np, indrawatigaupalika@gmail.com

Url: indrawatimun.gov.np, Mobile Apps: Indrawati Rural Municipality

Audio Notice No: 1618070731100

ईन्द्रावती समृद्धिको आधार; शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन र पुर्वाधार ”



स्थानीय सरकार

ईन्द्रावती गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

नवलपुर, सिन्धुपाल्चोक, बागमती प्रदेश, नेपाल
पुर्वाधार विकास तथा वातावरण विपद व्यवस्थापन शाखा

प्रगति समिक्षा प्रस्तुतिकरण

ई.राजाराम घोरासैनी
शाखा प्रमुख

प्रस्तुतीकरणको विषय

- पुर्वाधार विकास तर्फ सम्पन्न तथा चालु ईन्द्रावती गाउँउपालिका तथा वडागत योजनाहरू
- ठेकका मार्फत भएका क्रमागत योजना
- ठेकका मार्फत भएका योजनाहरू
- DPR भएका योजनाहरू
- नक्सा पास
- विपद् व्यवस्थापन
- विकास का केही झलक

पूर्वाधार विकासको परिमाणगत सारश

पूर्वाधार विकासको परिमाणगत सारांश

क्र.	संडक	परिमाण
१	कालोपत्रे (मि)	०
२	हलान (मि)	३३
३	कजवे (वटा)	०
४	ग्रामेल (मि)	२,६६०
५	सोलिड (मि)	१,०४२
६	पक्की नाली (मि)	१,१५१
७	मेसिनरी वाल (घ.मि)	३६
८	र्याविन वाल (घ.मि)	६११
९	ट्यूम पाइप (मि)	१८
१०	विस्तार (कि.मि)	३१
११	मर्मत तथा सफा (कि.मि)	१९६
१२	नया टांयाक (कि.मि)	४०६
१३	विषद व्यवस्थापन तथा नदी नियन्त्रण	परिमाण
१	आर.सि.सि वाल (मि)	०
२	मेसिनरी वाल (घ.मि)	५०
३	र्याविन वाल (घ.मि)	३०८
४	बायो इजिनियरिङ (वर्ग.मि)	२००

ख	बानेपानी	परिमाण	ग	सिंचाई	परिमाण
१	घरसुरी तथा धारावटा	२६९,१००	१	सिंचाई द्याइकी (वटा)	२१०
२	द्याइकी (वटा)	५,१००	२	आर.सि.सि कूलो (मि)	२४५,१००
३	इनटेक (वटा)	३,१००	३	मेसिनरी कूलो (मि)	२१,२०
४	कलेक्सन तथा डिसी (वटा)	०	४	सिंचाई पाइप (मि)	१,१३०,१००
५	पाइपलाइन (कि.मि)	६,१००	५	धेरावार (वटा)	०
६	धेरावार (वटा)	०	६	नया कूलो सेन्जे (मि)	०
७	अन्य मर्मत	१,१००	७	मेसिनरी वाल (घ.मि)	२०,१३०
८	र्याविन वाल (घ.मि)	०	८	र्याविन वाल (घ.मि)	०
९	कूलो मर्मत (मि)	१५,३१५	९		

च	खेलकुद, पर्फर्टन तथा अन्य सार्वजनिक नियन्त्रण	परिमाण
१	पदमार्ग (मि)	६६५,१००
२	पार्क (वटा)	०
३	मठमन्दिर (वटा)	२०,१००
४	सतल (वटा)	११,१००
५	गुम्बा तथा छोरतेड (वटा)	३,१००
६	चर्च (वटा)	०
७	दाहमस्कार स्तल (वटा)	३,१००
८	प्रतिक्रिया तथा चौतारी (वटा)	८,१००
९	खेलमैदान (वटा)	१,१००
१०	मेसिनरी वाल (घ.मि)	११६,१२
११	र्याविन वाल (घ.मि)	०
१२	रेलिङ (मि)	११९
१३	धेरावार (मि)	०
१४	झोंगेश्वरा (वटा)	१

घ	भवन	परिमाण
१	प्रशासनिक भवन	२१०
२	अस्पताल भवन	१
३	स्वास्थ्य चौकी भवन	०
४	आदारमुत स्वास्थ्य इकाइ भवन	०
५	सामुदायिक भवन	१२१०
६	विद्यालय भवन	१
७	सार्वजनिक सौचालय	११०
८	मेसिनरी वाल (घ.मि)	०
९	र्याविन वाल (घ.मि)	२४०
१०	भवन मर्मत	१
११	भवन धेरावार (मि)	

आ व ०७८।७९ प्रथम चौमासिक सम्म ठेका प्रक्रियामा भएका मुख्य योजना

क्र.स	आयोजनाको नाम	ठेका नं	ठेका सम्झौता रकम	निर्माण कम्पनी	ठेका सम्झौता मिति	अवधि	सम्पन्न गर्ने पर्ने मिति	स्थाद थप अवधि	स्थाद थप सम्पन्न गर्ने पर्ने मिति	भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगति प्रतिशतमा	आर्थिक प्रगति प्रतिशतमा	कैफियत	
१	बाहनेपाटि प्याघर गोलमाथान ऐसेलुखर्क सडक स्तरोन्ती बडा नं ५	IRMSI/W/N CB/078/079-02	१,३६,९०,४४६।८४	श्री सप्तपथ /यू एण्ड एस जे.भी, मार्किफेदा, काष्ठे ।	२०७८।०८।१३	५ महिना	२०७९।०९।१३				०।००	०।००		
२	मिजारटोल राममन्दिर देउराली सडक स्तरोन्ती	IRMSI/W/N CB/078/079-03	१४,६९६,०५८।४३	श्री सप्तपथ /यू एण्ड एस जे.भी, मार्किफेदा, काष्ठे ।	२०७८।०८।१३	५ महिना	२०७९।०९।१३				५।००	०।००		
३	सिपाधाट रिपोर्ट तिनघरे थाँपचौर कुञ्चोक सडक स्तरोन्ती	IRMSI/W/N CB/078/079-04	१४,५०३।९४।९४	श्री व्यासेफिक ईन्जिनियरिङ कम्पनी प्रा.लि धुम्वाराही काठमाण्डौ	२०७८।०९।२३	५ महिना	२०७९।१२।२३				०।००	०।००		
४	ज्यामिरेमाने नवलपुर सडक स्तरोन्ती	IRMSI/W/N CB/078/079-05	५२,१२३,३४५।०७	श्री घिसिड /यू एण्ड यस जे. भी मार्किफेदा, काष्ठे ।	२०७८।०८।२१	७ महिना	२०७९।१०।२१				५।००	०।००		
५	नवलपुर मार्थ्यमिक विद्यालयको भवन निर्माण गर्ने कार्य	IRMSI/W/N CB/078/079-06	१६,१९७,४७७।३९	श्री धुलिखेल /यू यस जे. भी बनेपा काष्ठे	२०७८।०९।०६	६।५ महिना	२०७९।१०।२१				०।००	०।००		
६	इन्द्रावती गाउँपालिका भवन पछाडी ल्यान्डस्केपिङ गर्ने	IRMSI/W/S Q/078/079-01	१,९८६,६९६।८६	श्री स्वराज कन्स्ट्रक्शन मेलम्ची १३ सिन्धुपाल्चोक	२०७८।०८।२१	३ महिना	२०७९।१०।२१				१००।००	०।००		
७	झोलुझो पुल सम्बन्धित स्टिलजन्य सामान खरीद	IRMS/G/NC B/078/079-01												ठेका सम्झौता प्रक्रियामा

आ व ०७८।७९को प्रथम चौमासिक सम्म ठेका प्रक्रियामा भएका कमागत मुख्य योजना

क्र.सं	आयोजनाको नाम	ठेका नं	ठेका सम्झौता रकम	निर्माण कम्पनी	ठेका सम्झौता मिति	अवधि	सम्पन्न गर्न पर्ने तथा भएको मिति	स्थाद थप सम्पन्न गर्न पर्ने मिति	भुक्तानी रकम	भौतिक प्रगति प्रतिशतमा	आर्थिक प्रगति प्रतिशतमा	कैफियत
१	नवलपुर प्रायामिक अस्पताल	IRMSI/W/NCB/07 5/076-08	५९,४०९,७७१००	श्री न्यू ड्रागन परिवर्त मल्टिपल जे.भी	२०७६।०५।२२	२४ महिना	२०७८।०५।२२		२०७८।०५।२२	५,६०,१२,०००।००	१००।००	१००।००
२	ऐसेलखर्क माथ्यामिक विद्यालय	IRMSI/W/NCB/07 6/077-03	२६,६५२,२३५।४९	श्री धुलिखेल निर्माण सेवा	२०७६।०९।८८	२३ महिना	२०७८।०८।२०		२०७८।०८।२०	२५,९५२,२३५।४९	१००।००	१००।००
३	इन्द्रावती गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन	IRMSI/W/NCB/07 6/077-05	६५९७२९९३।४४	श्री टक्सार स्वराज जे.भी।	२०७६।८।३	१५ महिना	२०७८।०९।८३		२०७८।०८।३	६५,९७२,९९३।४४	१००।००	१००।००
४	इन्द्रावती रंगशाला निर्माण	IRMSI/W/NCB/07 6/077-16	३७,९९९,२०९।९३	श्री बोल्डवाइड आर वि जे.भी	२०७७।०२।२९	११ महिना	२०७८।०९।२९		२०७८।०८।२०		१००।००	८०
५	कुञ्ज्योक खा.पा. योजना वडा नं ३	IRMSI/W/NCB/07 7/078-02	२०,७९१,९९३।८२	श्री भिमेश्वर बोल्डवाइड आकाश जे.भी, मेलम्ची ११ सिन्धुपाल्चोक	२०७७।०९।२१	९ महिना	२०७८।०६।२१	३ महिना	२०७८।०९।२१	२०,२३५,४९२।५८	९८।००	९७।३३
६	मानेडाङ्गा हुदै काप्रे किमुद खानेपानी योजना वडा नं १	IRMSI/W/NCB/07 7/078-03	४,६७८,२३६।९६	श्री नवोदय कन्स्ट्रक्शन कम्पनी पा.लि, इन्द्रावति ७ सिन्धुपाल्चोक	२०७७।०९।०८	४ महिना	२०७८।०९।०८	७ महिना	२०७८।०८।२०	४,९८४,९८७।६८	१००।००	८९।४६
७	सिंपाधाट रिपेनी तिनघरे आपचौर कुञ्ज्योक सडक	IRMSI/W/NCB/07 7/078-04	१०२७०।९७।३५	श्री आर .डि. आर कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स पा.लि, इन्द्रावति ४ सिन्धुपाल्चोक	२०७७।८।३	३ महिना	२०७८।०३।८३	५ महिना	२०७८।०८।२०	१०,०५०,१४७।३५	१००।००	९७।८५
८	बाहुनवेशी तल्लागाँउ मोड सडक स्तरोन्नती वडा नं ३	IRMSI/W/NCB/07 7/078-05	२,१२३,६६९।८३	श्री अद्वित्य कन्स्ट्रक्शन पा.लि, गोदावरी ललितपुर	२०७७।८।३	३ महिना	२०७७।०२।८३	६ महिना	२०७८।०८।२०	१,६३४,२९२।८३	१००।००	७६।९६
९	बाहुनेपाटि प्युधर ऐसेलुखर्क सडक स्तरोन्नती वडा नं ५	IRMSI/W/NCB/07 7/078-07	८,९६६,७६३।८२	श्री आर .डि. आर कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स पा.लि, इन्द्रावति ४ सिन्धुपाल्चोक	२०७६।८।०९	४ महिना	२०७७।०३।८३	५ महिना	२०७८।०८।२०	५,०८८,०८९।४४	१००।००	५६।७४
१०	जिरोकिलो नवलपुर लहरेमाने मानेडाङ्गा सडक स्तरोन्नती वडा नं ४८।१	IRMSI/W/NCB/07 7/078-08	४२४९।८६६५।२१	श्री काश्यप निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स पा.लि, कलकी १२ काठमाण्डौ	२०७७।८।३	९ महिना	२०७८।०९।८३			५,३७२,१८३।४२	४०।००	१२।६४
११	भुकम्प स्मारक भक्टी पाक निर्माण वडा नं ४	IRMSI/W/NCB/07 7/078-09	९,६९८,९०३।८७	टि.एस.एनाआर .डि. आरानवोदय जे.भी, काठमाण्डौ	२०७८।०२।३०	६ महिना	२०७८।०८।३०	३ महिना	२०७८।११।३०		४५।००	

आ.व. २०७८/०७८ मा डि.पी.आर तयार भएका योजनाहरू

भवन निर्माण नक्सा पास

विवरण	संख्या
भवन नक्सा पास	३
भवन निर्माण अभिलेख	१०
अमिन फिल्ड जाच	१२

विपद व्यवस्थापन

विपद निवेदनहरुको विवरण

दर्ता नं.	दर्ता मिति	घटना मिति	बडा नं.	दर्ता गर्नुहुने व्यक्तिहरुको नाम	विषय	क्षति भयका स्थानहरु			कैफियत
						धर	गोठ	खेत	
१	२०७८।०३।२०	२०७८।०३।२०	२	जालिम गिरी	धानखेत पुरीएको			✓	
२	२०७८।०३।११	२०७८।०३।११	६	अर्जुन प्रसाद भट्टराई	धानखेत पुरीएको			✓	
३	२०७८।०३।१७	२०७८।०३।१३	४	सुनिता बोगटी	घरमुनी पहिरो गएको	✓			त्रिपाल
४	२०७८।०३।१४	२०७८।०३।१०	७	झम्क ब. वि. क	घरअगाडि पहिरो गएको	✓			त्रिपाल
५	२०७८।०३।२०	२०७८।०३।१६	७	लक कुमारी जुनारी	घर तथा सेप्टिक ट्याउडक जोखिममा	✓			त्रिपाल
६	२०७८।०३।२३	२०७८।०३।१५	७	हर्क ब. दमै	गोठ जोखिममा		✓		त्रिपाल
७	२०७८।०३।०६	२०७८।०३।०४	७	केदारनाथ अधिकारी	घरअगाडि पहिरो गएको	✓			
८	२०७८।०३।२४	२०७८।०३।१८	७	इन्द्र ब. दमै	घरपछाडि पहिरो गएको	✓			
९	२०७८।०४।२६	२०७८।०३।०१	५	वागमारा खेत विकास समिति	स्थानियहरुको खेत पुरीएको			✓	
१०	२०७८।०४।२६	२०७८।०३।०१	५	कोईरालाटार	खेत पुरीएको			✓	
११	२०७८।०४।२६	२०७८।०३।०१	८	लाक्पा तामाङ	घरमुनी पहिरो गएको	✓			त्रिपाल
१२	२०७८।०४।२६	२०७८।०४।१०	८	तोक ब. श्रेष्ठ	घरअगाडि पहिरो गएको	✓			त्रिपाल
१३	२०७८।०४।२६	२०७८।०३।३०	४	कूणा वहादुर अधिकारी	गोठ जोखिममा		✓		त्रिपाल
१४	२०७८।०४।२६	२०७८।०३।२५	४	चित्र ब. खत्री	खेत पुरीएको			✓	
१५	२०७८।०४।२६	२०७८।०४।०२	७	नवराज श्रेष्ठ	घरपछाडि पहिरो गएको	✓			
१६	२०७८।०५।१३	२०७८।०३।१७	६	लक्ष्मी माया श्रेष्ठ	घरअगाडि पहिरो गएको	✓			
१७	२०७८।०५।१५	२०७८।०३।१७	२	२ नं. बडा कार्यालय	पुल जोखिममा (पुर्वाधार विकास कार्यालयमा सिफारिस)				


विपद व्यवस्थापन

१८	२०७८ १०५ १५	२०७८ १०३ १७	२	होम बहादुर	घरअगाडि पहिरो गएको	✓			
१९	२०७८ १०५ १५	२०७८ १०३ २२	२	विमल गिरी	घरअगाडि पहिरो गएको	✓			
२०	२०७८ १०५ १५	२०७८ १०३ १४	२	अर्जुन गिरी	खेतमा पहिरो		✓		
२१	२०७८ १०५ १५	२०७८ १०३ १८	२	चेत ब. आचार्य	घरअगाडि पहिरो गएको	✓			
२२	२०७८ १०५ १५	२०७८ १०३ १८	२	जनक थापामगर	घरअगाडि पहिरो गएको	✓			
२३	२०७८ १०५ १५	२०७८ १०३ १८	२	दल ब. भारती	घरअगाडि पहिरो गएको	✓			
२४	२०७८ १०५ १२	२०७८ १०५ १३	७	कामी सार्की	घरअगाडि पहिरो गएको	✓			
२५	२०७८ १०५ १७	२०७८ १०५ १३	७	लेखनाथ न्यौपाने	घरमाथी पहिरो गएको	✓			
२६	२०७८ १०५ १७	२०७८ १०५ १३	७	छन्द ब. भूजेल	घरअगाडि चक्केको	✓			
२७	२०७८ १०५ १७	२०७८ १०५ १३	७	वाटुली सार्की	घरअगाडि चक्केको	✓			
२८	२०७८ १०५ २७	२०७८ १०३ २७	२	भिम ब. श्रेष्ठ	खेतमा पहिरो		✓		
२९	२०७८ १०५ २९	२०७८ १०५ २२	१	वैल ब. तामाङ	घरमुनी पहिरो गएको	✓			
३०	२०७८ १०५ २९	२०७८ १०५ २२	१	श्री तेतार्या इडीरी छोलिङ गुम्बा	गुम्बा को घडेरी चिरा परेको			गुम्बा	
३१	२०७८ १०५ २७	२०७८ १०५ २२	५	मसली भुजेल	पहिरोको कारण घर तथा गोठ जोखिममा	✓	✓		
३२	२०७८ १०५ २७	२०७८ १०५ २१	४	लक्ष्मी प्र. सापकोटा र रसिला सापकोटा(संयुक्त)	पहिरोको कारण घर जोखिममा	✓			
३३	२०७८ १०५ २७	२०७८ १०५ २१	५	नेत्र ब. कटुवाल	पहिरोको कारण घर तथा चर्पी जोखिममा	✓			
३४	२०७८ १०५ २७	२०७८ १०५ २१	५	टेक ब. कटुवाल	पहिरोको कारण घर जोखिममा	✓			
३५	२०७८ १०५ २७	२०७८ १०५ २२	४	विष्णु माथा लामा	पहिरोको कारण घर जोखिममा	✓			
३६	२०७८ १०५ २१	२०७८ १०५ २०	४	लक्ष्मी प्र. सापकोटा	खेतमा पहिरो		✓		
३७	२०७८ १०५ २१	२०७८ १०५ २०	७	नवराज श्रेष्ठ	घरअगाडि पहिरो गएको	✓		त्रिपाल	
३८	२०७८ १०५ २१	२०७८ १०५ २०	४	ठाक्कर ब. राना मगर	घरअगाडि पहिरो गएको	✓			
३९	२०७८ १०५ २१	२०७८ १०५ १९	२	दल ब. भारती	घरअगाडि पहिरो गएको	✓			
४०	२०७८ १०५ २१	२०७८ १०५ १३	२	वडा नं. २ वडा कार्यालय	घरहरु तथा वस्ती खतरामा	✓			

विपद व्यवस्थापन

४१	२०७८।०५।२१	२०७८।०५।१५	४	राम व श्रेष्ठ	घरअगाडि पहिरो गएको	✓		
४२	२०७८।०५।२१	२०७८।०५।१५	४	राजकुमारी नेपाली	घरअगाडि पहिरो गएको	✓		
४३	२०७८।०५।१२	२०७८।०५।१६	२	विमल गिरी	घरअगाडि पहिरो गएको	✓		
४४	२०७८।०५।२१	२०७८।०५।२१	४	भवन प्रसाद मिश्र	घर जोखिममा	✓		
४५	२०७८।०६।१२	२०७८।०५।२१	१०	धन व थापा	खेतमा पहिरो		✓	
४६	२०७८।०६।१२	२०७८।०५।२०	७	नरन कार्मी	घरअगाडि पहिरो गएको	✓		
४७	२०७८।०६।१२	२०७८।०५।२५	७	बद्रि चिमिरे	घरअगाडि पहिरो गएको	✓		
४८	२०७८।०६।१२	२०७८।०५।२०	७	यज व पाण्डे	घरअगाडि पहिरो गएको	✓		
४९	२०७८।०६।१२	२०७८।०५।२५	१२	टक व न्यौपाने	घरअगाडि पहिरो गएको	✓		
५०	२०७८।०६।१२	२०७८।०५।२०	७	लेख व वि.क	घरअगाडि पहिरो गएको	✓		
५१	२०७८।०६।१२	२०७८।०५।२१	७	सन्तोष तामाङ	घरअगाडि पहिरो गएको	✓		
५२	२०७८।०६।१३	२०७८।०५।२१	५	देवी गीतम	घर जोखिममा	✓		
५३	२०७८।०६।१८	२०७८।०६।१५	६	मेन्द्र व शाहि र विमला हमाल (संयुक्त)	घरमारी पहिरो गएको	✓		
५४	२०७८।०६।१५	२०७८।०६।१५	५	राधिका दुगांता	घरमारी पहिरो गएको	✓		
५५	२०७८।०६।१५	२०७८।०६।१५	४	सन्त व तामाङ	घर जोखिममा	✓		
५६	२०७८।०६।१५	२०७८।०६।१५	४	विनोद विक्रम थापा	खेतमा पहिरो		✓	
५७	२०७८।०५।२३	२०७८।०५।१५	१२	दिग्गालाल श्रेष्ठ	घर बगाएको	✓		
५८	२०७८।०५।२१	२०७८।०५।१५	४	लाल व तामाङ	घरमारी पहिरो गएको	✓		
५९	२०७८।०७।०४	२०७८।०६।१५	७	तेज व कार्मी	गोठ जोखिममा		✓	
६०	२०७८।०७।२३	२०७८।०५।२२	५	सर्व व मार्मी	मत्थ			
६१	२०७८।०७।२३	२०७८।०५।२१	२	रुकु थापा	घर जोखिममा	✓		
६२	२०७८।०६।१८	२०७८।०५।२१	३	बाहनेवेशी क्षेत्र एकमण्ड	वस्ती जोखिममा	✓		
६३	२०७८।०७।१०	२०७८।०५।२८	२	अर्जन गिरी	खेतमा पहिरो		✓	
६४	२०७८।०८।०९	२०७८।०५।२८	४	ठाकर व. राना मगर	घर जोखिममा	✓		
६५	२०७८।०८।०९	२०७८।०५।२८	२	विमला आचार्य	घर जोखिममा	✓		
६६	२०७८।०८।०९	२०७८।०५।२८	४	कुमारी लामा	घर जोखिममा	✓		
६७	२०७८।०८।०९	२०७८।०५।२८	४	भवन प्रसाद मिश्र	घर जोखिममा	✓		

विकासका केही झलकहरु

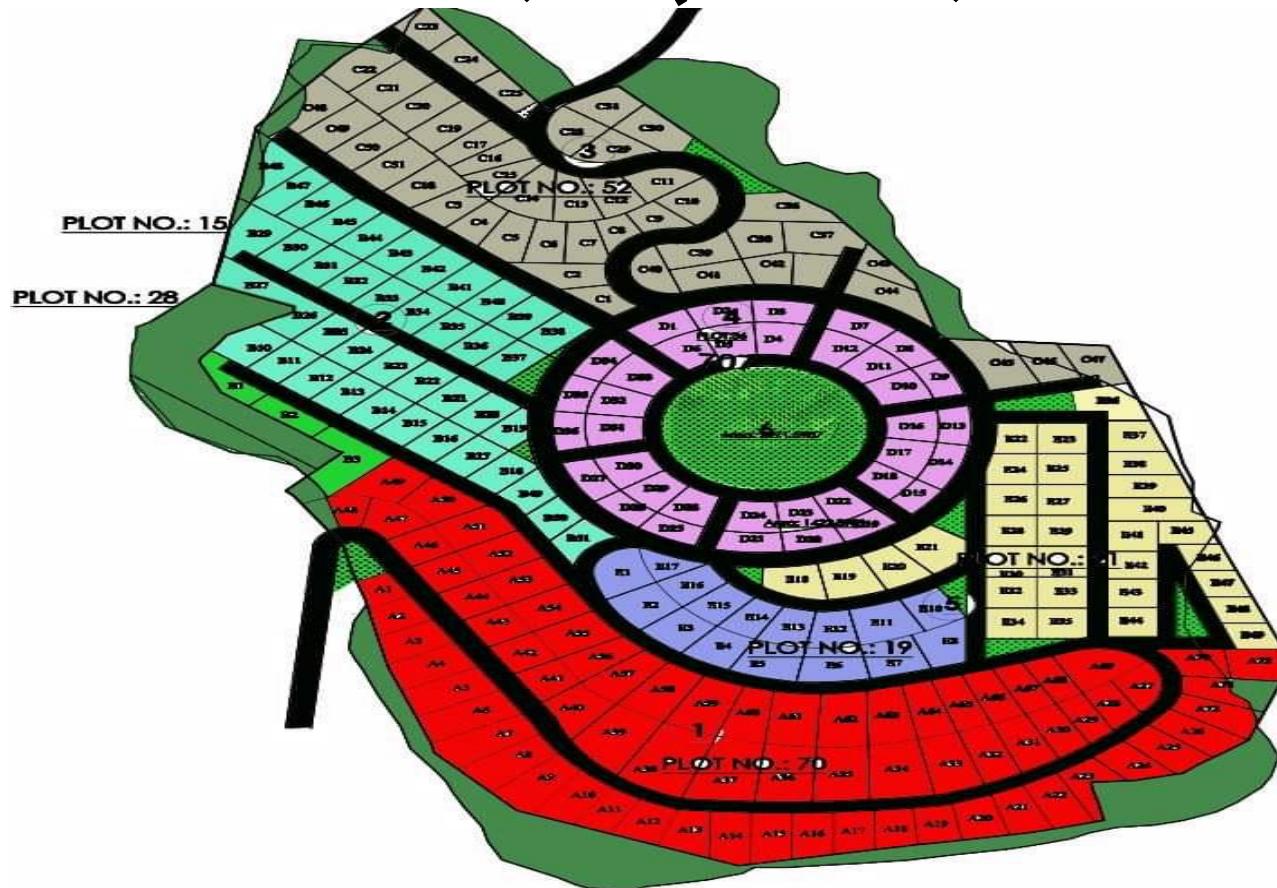

बुढीचौर एकिकृत वस्ती परियोजना, ईन्द्रावती-१०,
बुढीचौर

विकासका केही झलकहरु



- ईन्द्रावती रंगशाला, ईन्द्रावती-५, ऐसेलुखर्क

विकासका केही झलकहरु



- नवलपुर प्राथमिक अस्पताल, ईन्द्रावती-४,
नवलपुर

विकासका केही झलकहरु



• , ऐसेलुखर्क नमूना विद्यालय ईन्द्रावती-५,



बाहुनेपाटी पिउघर सडक स्तरोन्नती हुँदै

2078/03/17
3+250



रिपेनी तिनघरे आँपचौर सडक स्तरोन्तती हुँदै

false work




ch 0+570 staircase



जिरोकिलो मानेडाँडा सडक स्तरोन्ती हुँदै


plum base work
in 0 kilo
ch-5+960

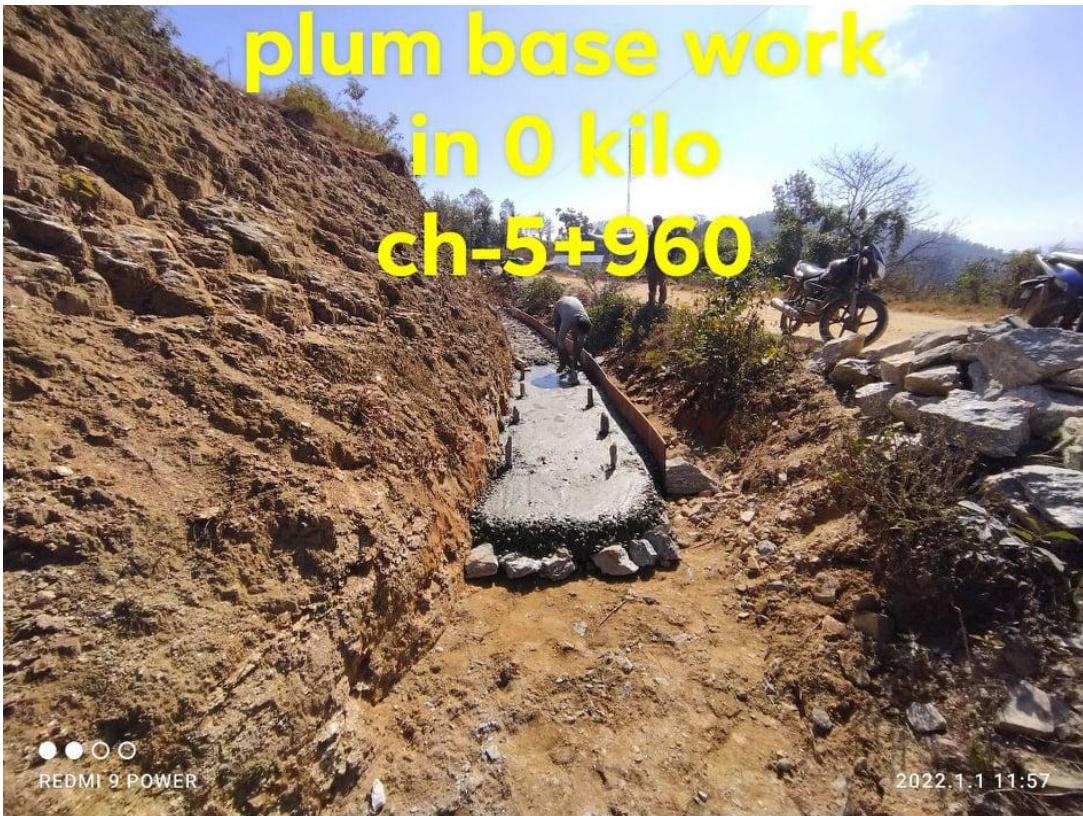

Ch-1+880
gabion
foundation



ज्यामिरेमाने नवलपुर सडक स्तरोन्नती हुँदै

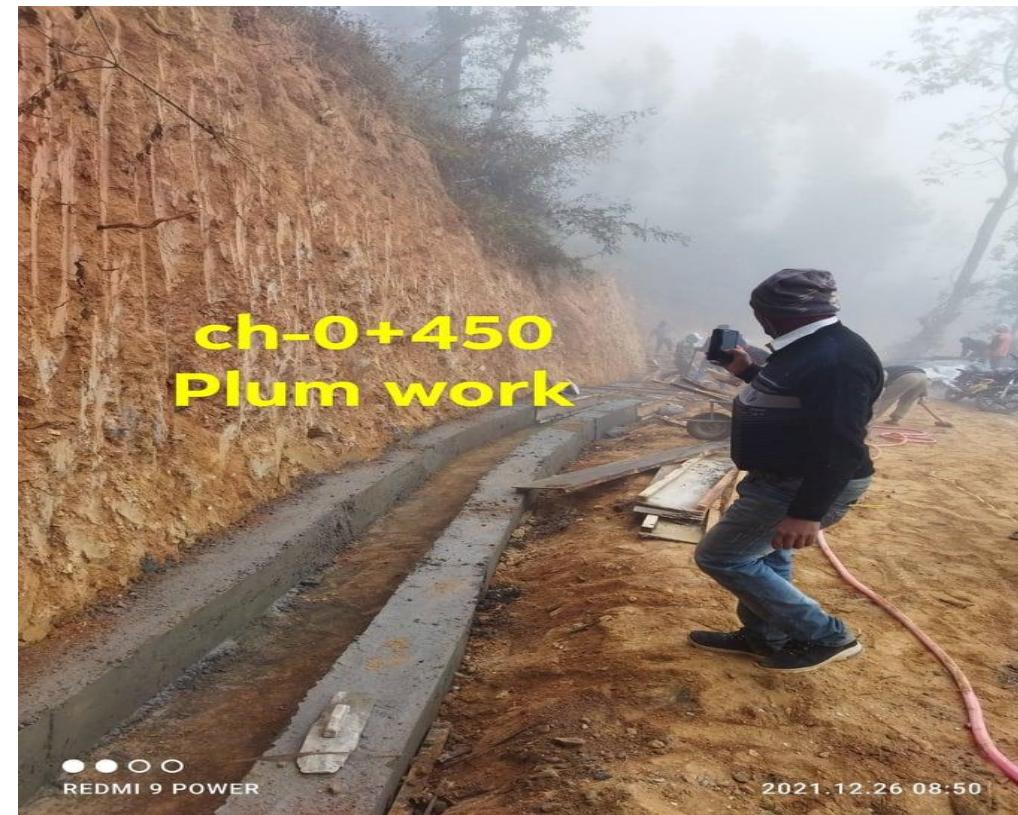

मिजारटोल राममन्दिर देउराली सडक स्तरोन्ती हुँदै



बाहुनेवेशी खुतुमेडाङा सडक स्तरोन्नती हुँदै



● ● ○
SHOT ON POCO X3 NFC




कुञ्चोक खापा योजना



काभ्रेडाङ्ग किमूद खापा योजना वडा न १



अर्चले खापा योजना वडा न ८

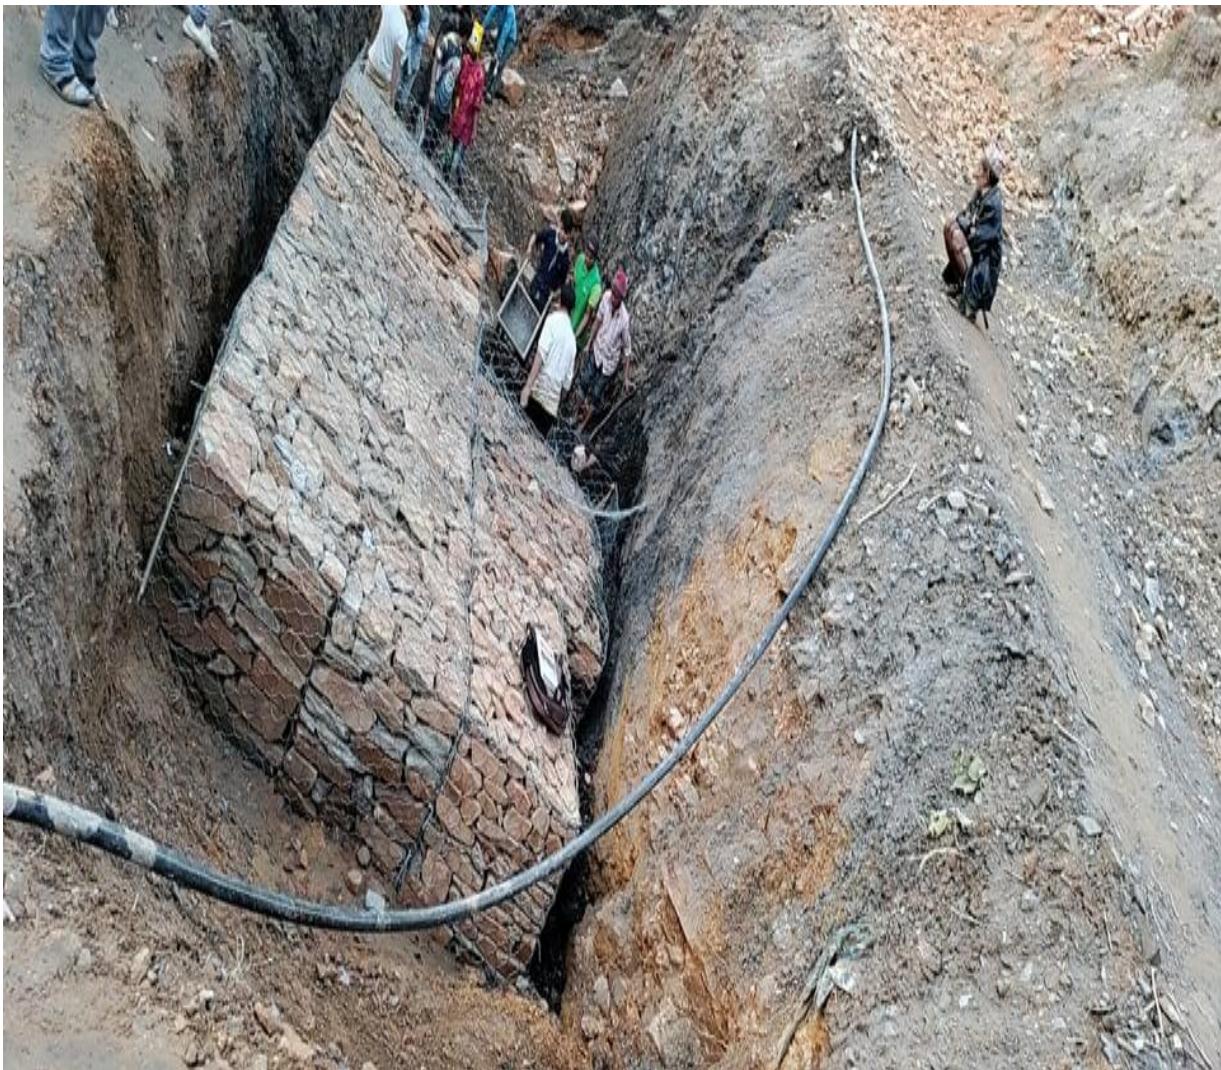

धारापानी सडक वडा न १०



भोलचोक सेतीदेवी सडक वडा न ११



बाहुनेपाटी सूर्यकोट सडक वडा नं. ५



उपल्लो गाँउ दाहसस्कार स्थल वडा नं. ५



भुकम्प स्मारक पार्क वडा नं. ४



ढोटार सिन्चाई वडा नं. १२

.....

Thank
you!

